

31 MAR, 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Παπάγου, 30-3-2016

Αριθ. Πρωτ. Β-974

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Αναστάσεως & Τσιγάντε
Τ.Κ. : 101 91 Παπάγου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Στ. Σμαραΐδου
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6508315
FAX : 6508299
E mail : tkvel@yme.gov.gr

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε Ερώτηση. "Μελέτες κανονικοποίησης, βελτίωσης, αναβάθμισης υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής Πάτρας-Πύργου- Αλφειού- Ολυμπίας και της γραμμής Αλφειού -Κυπαρισσίας –Καλαμάτας και κατασκευή του έργου. Καλαμάτας και κατασκευή του έργου".

ΣΧΕΤΙΚΟ: Έγγραφό σας 3239/17-2-2016.

Σε απάντηση της Ερώτησης με αριθμό 3239/17-2-2016 την οποία κατέθεσε στη Βουλή ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Τσαβάρας, σας αποστέλλουμε το με αριθμό 274728/29-2-2016 έγγραφο της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., με το οποίο παρέχονται πληροφορίες σχετικές με τα θιγόμενα σε αυτή θέματα.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Κοινοποίηση

1. Βουλή των Ελλήνων
Βουλευτή κ. Κωνσταντίνο Τσαβάρα
2. Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού
Γραφείο Υπουργού



ΕΡΓΟΣΕ**ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε****ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ**

B-974




Ημερομηνία: 29.02.2016
 Αριθ. Πρωτ.: 274728
 Αριθ. Συμβ.: -
 Κωδ. Τοπ.: -
 Φακ.Αρχ.Τμήμ.: 01.02.5

Προς: Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
 Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
 Αναστάσεως και Τσιγάντε, 10191 ΠΑΠΑΓΟΥ
 Τ. 210 6508320-8326 – F. 210 6508299
 e-mail : tkvel@yme.gov.gr

Κοιν:

- ΟΣΕ Α.Ε.
 Γραφείο Προέδρου ΔΣ
 Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου
- ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.
 1. Πρόεδρος Δ.Σ.
 2. Διεύθυνση Έργων Ι
 3. Κ.Φ.

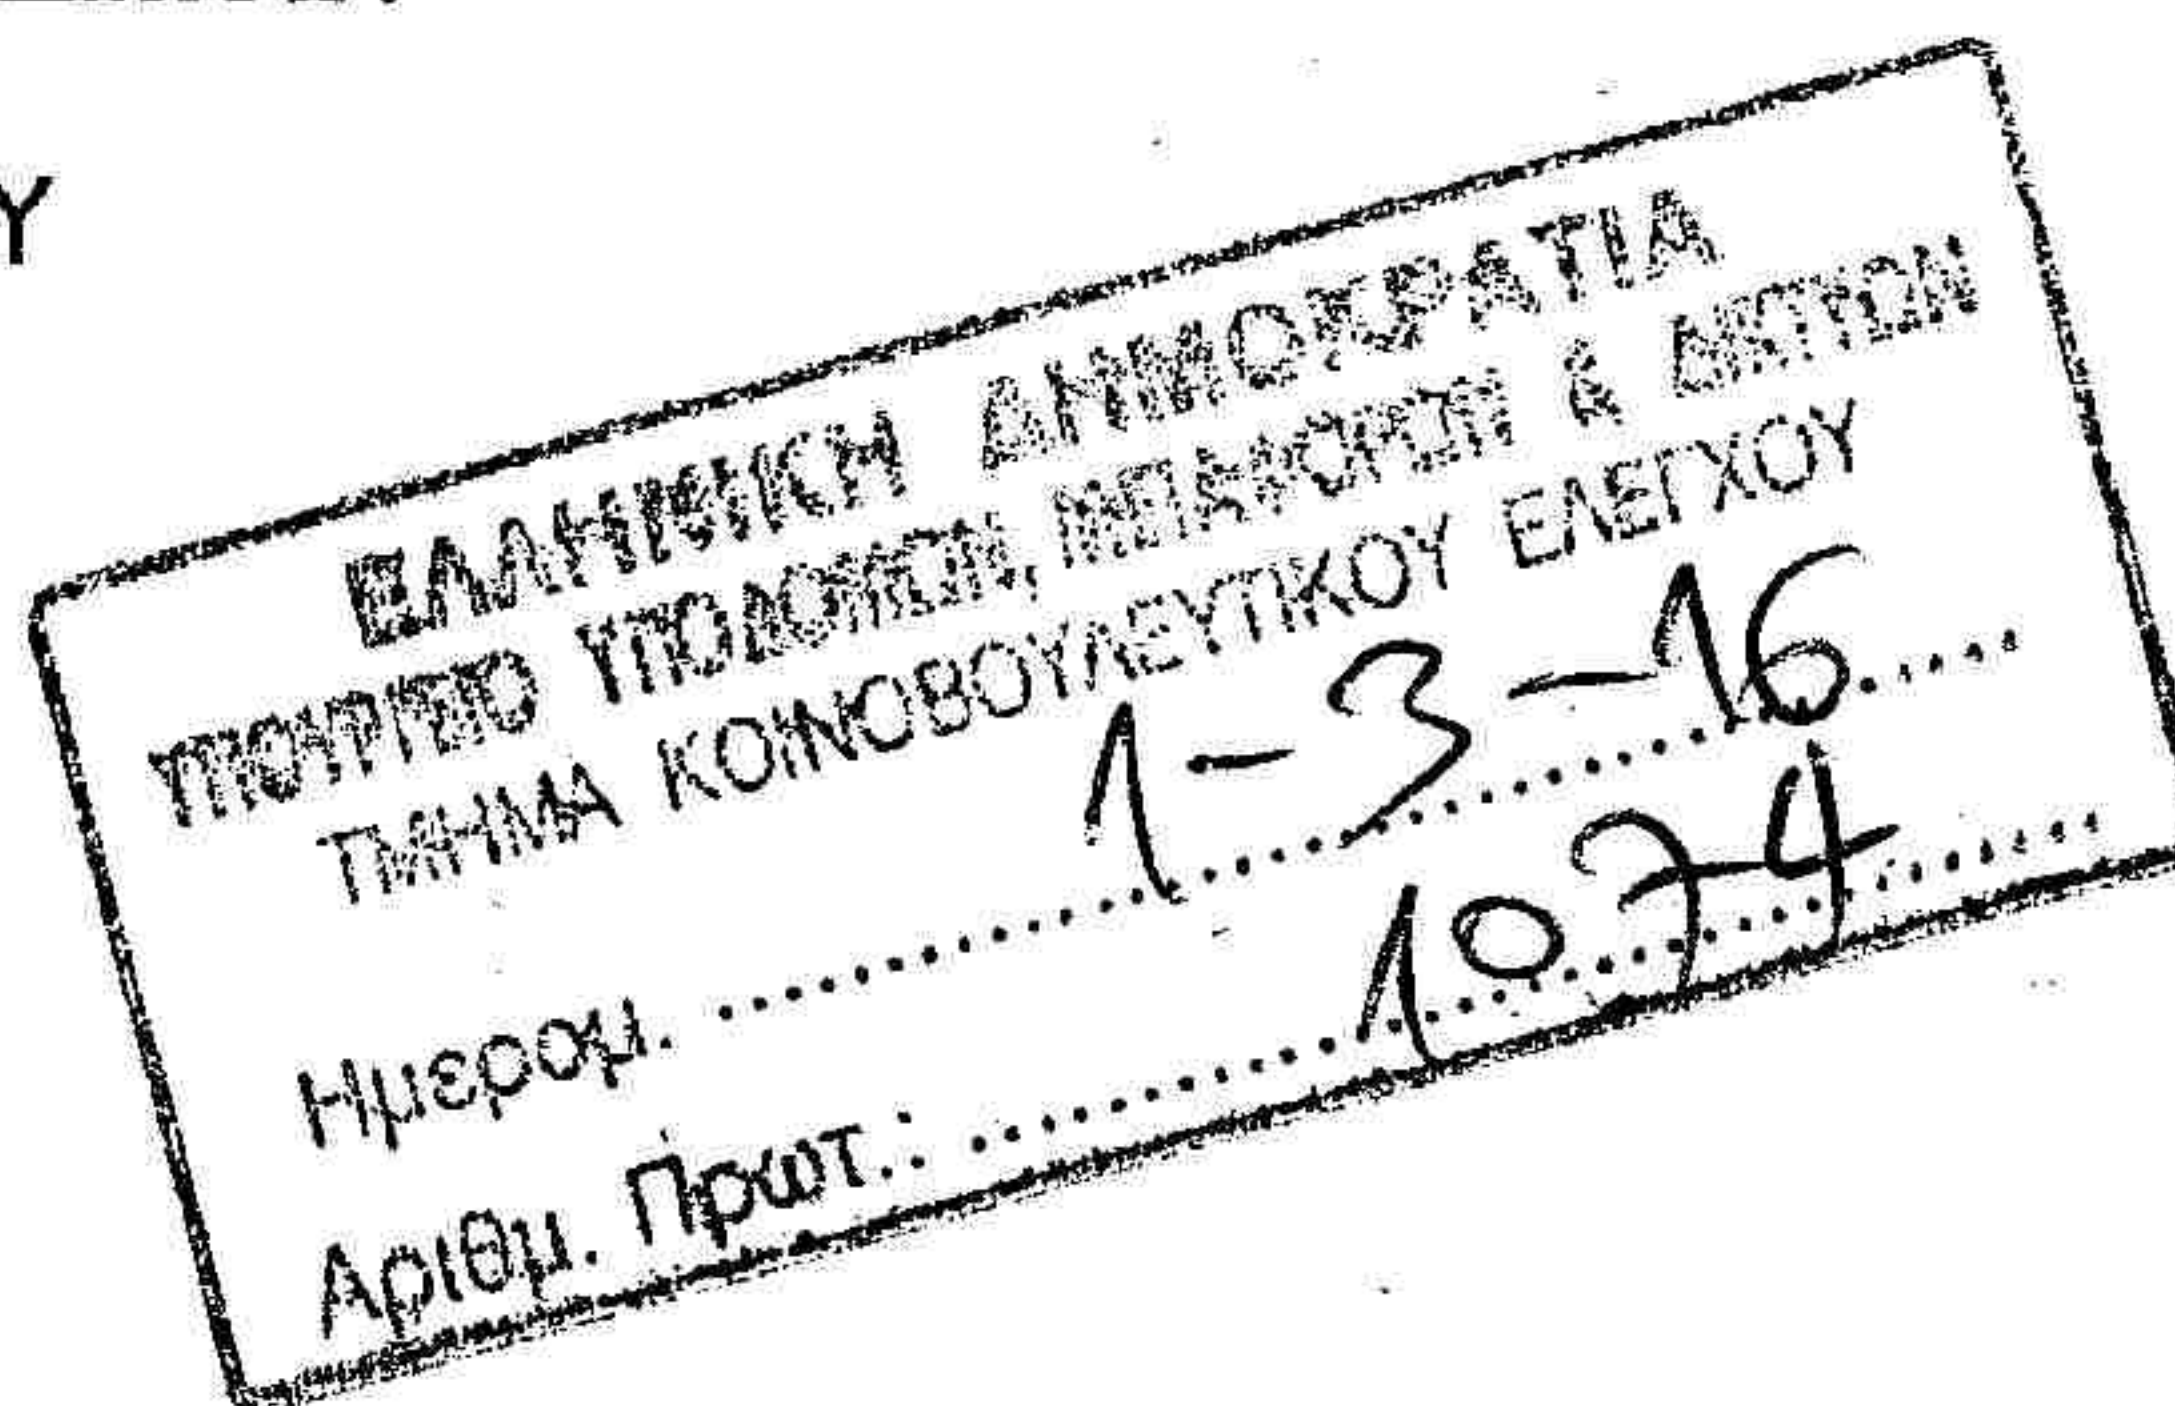

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ' αριθμ. 3239/17-02-2016 Ερώτηση Βουλής

Σχετ. : Το υπ' αριθμ. B-974/19-02-2016 έγγραφο Τμ. Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (α.π. ΕΡΓΟΣΕ 274241/19-02-2016)

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, το οποίο αφορά στην υπ' αριθμ. 3239/17-02-2016 Ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή κ. Τζαβάρα Κωνσταντίνο, στα θέματα τα οποία άπτονται της αρμοδιότητας της ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :

- Σας ενημερώνουμε ότι, με την υπ' αριθμ. Ε (2008)7981/11-12-2008 Απόφαση της Ε.Ε., εγκρίθηκε η χρηματοδότηση των μελετών κανονικοποίησης, βελτίωσης και αναβάθμισης της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής Πάτρας – Πύργου – Αλφειού – Ολυμπίας και της γραμμής Αλφειού –Κυπαρισσίας – Καλαμάτας. Ο προϋπολογισμός της Απόφασης ήταν 31 εκατ. €.
- Η εν λόγω εγκριτική Απόφαση τροποποιήθηκε αρχικά με την υπ' αριθμ. C(2012) 8489/15-11-2012 Απόφαση με την οποία ο προϋπολογισμός μειώθηκε στα 17,91 εκατ. € περίπου, λόγω των μεγάλων εκπτώσεων που λαμβάνονταν κατά τη δημοπράτηση των συμβάσεων μελετών και κατόπιν με την υπ' αριθμ. C(2013) 8226/18-11-2013 Απόφαση, με την οποία τροποποιήθηκε εν μέρει το φυσικό αντικείμενο της δράσης, δεδομένου ότι δεν ήταν δυνατή η πλήρης ολοκλήρωσή του έως τη λήξη της περιόδου επιλεξιμότητας (31-12-2015). Ο προϋπολογισμός με βάση τη 2η τροποποιητική Απόφαση είναι 10,8 εκατ. €.

Οι μελέτες οι οποίες περιλαμβάνονται στην ανωτέρω Απόφαση είναι οι κάτωθι :

Πληροφορίες : Ι. Καραμπογιάνης / Δ/ση Μελετών Τ. 210 5283430 - F. 210 5283426 - E-Mail: yokaramp@ergose.gr
 Καρόλου 27, 104 37 ΑΘΗΝΑ - <http://www.ergose.gr>

Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΑΝΑΔΟΧΟΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (€)	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (μετά την έκπτωση) (€)
1	ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΥΡΓΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΣ (Α.Σ. 591/09)	<ul style="list-style-type: none"> • ΠΛΑΣ ΕΠΕ - Ι. ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ - Α. ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ • ΜΕΤΕΒΑ - Ε. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. • ΟΒΕΡΜΕΥΕΡ ΠΛΑΝΕΝ + ΒΕΡΑΤΕΝ GmbH • Γ. ΣΕΚΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. • ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε 	4.193.602	3.354.883
2	Β' ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΑΤΡΑΣ- ΠΥΡΓΟΥ-ΑΛΦΕΙΟΥ- ΟΛΥΜΠΙΑΣ / ΤΜΗΜΑ 1: ΠΑΤΡΑ - Σ.Σ. ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ (ΑΣ 725/13)	<ul style="list-style-type: none"> • Ν. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ • STAND ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. • ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. • ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Μ.Ε. • ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΧΟΣ • ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 	2.915.875	787.286,25
3	ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΑΤΡΑΣ- ΠΥΡΓΟΥ-ΑΛΦΕΙΟΥ- ΟΛΥΜΠΙΑΣ (Β' ΦΑΣΗ) / ΤΜΗΜΑ 2: Σ.Σ. ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ - ΟΛΥΜΠΙΑ (ΑΣ 733/13)	<ul style="list-style-type: none"> • Γ.Τ.Β. ΑΝΟΔΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ • ΧΑΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ • ΕΔΑΦΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ • ΚΑΛΟΥΔΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ • ΜΗΤΣΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 	2.214.977	909.139,01
4	ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΛΦΕΙΟΥ - ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ- ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΑΣ 558/13)	<ul style="list-style-type: none"> - Χ. ΡΑΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. με δ.τ. RACE ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε - ΛΑΖΑΡΟΣ Σ.ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ με δ.τ. ΥΔΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ ΕΕ - ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε. με δ.τ. ΓΕΟENVIRO Ε.Ε. - ΤΑΠΕΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 	1.836.768	699.454,42
5	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΛΦΕΙΟΥ - ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ- ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Β' φάση).		3.500.000	

Πληροφορίες: Ι. Καραμπογιάς / Δ/ση Μελετών Τ. 210 5283430 - F. 210 5283426 - E-Mail: yakaramp@ergose.gr

Καρόλου 27, 104 37 ΑΘΗΝΑ - <http://www.ergose.gr>

- Από τις ανωτέρω συμβάσεις μελετών έχει ολοκληρωθεί και παραληφθεί η σύμβαση με Α/Α 1, ενώ για τις συμβάσεις μελετών με Α/Α 2 & 3 έχει υποβληθεί το 100% του φυσικού τους αντικείμενου έως τις 31-12-2015 και βρίσκονται σε φάση ελέγχου με σκοπό την έγκριση και παραλαβή των συμβάσεων έως τα τέλη Μαρτίου του 2016.
Όσον αφορά στη σύμβαση με Α/Α 4, για αυτή έχουν υποβληθεί και ελέγχει το 100% του φυσικού της αντικείμενου, αλλά προκειμένου να γίνουν οι εγκρίσεις και η παραλαβή της σύμβασης, πρέπει πρώτα να εγκριθούν οι Περιβαλλοντικοί Όροι που αφορούν στο Τμήμα Καλό Νερό – Καλαμάτα.
Τέλος η σύμβαση μελέτης με Α/Α 5, δεν θα μπορέσει να εκτελεστεί δεδομένου ότι, η Απόφαση Χρηματοδότησης έληξε στις 31-12-2015 και ως προαπαιτούμενο είχε την ολοκλήρωση της σύμβασης με Α/Α 4, για την οποία έχει καθυστερήσει η έκδοση των Περιβαλλοντικών Όρων, όπου για το μεν πρώτο τμήμα Αλφειός – Κυπαρισσία εγκρίθηκαν το Σεπτέμβριο του 2015, ενώ για το τμήμα Καλό Νερό – Καλαμάτα, αναμένεται η έγκριση.
- Σχετικά με την ωριμότητα των μελετών της αναβάθμισης της σιδηροδρομικής γραμμής Πάτρα – Πύργος – Αλφειός – Ολυμπία και Αλφειός – Κυπαρισσία – Καλαμάτα, όπως προκύπτει και από τα προαναφερθέντα ισχύουν τα κάτωθι:
 - Όσον αφορά στο τμήμα Πάτρα – Πύργος – Αλφειός – Ολυμπία και Πύργος – Κατάκολο, οι μελέτες έχουν ολοκληρωθεί έως και τα τεύχη δημοπράτησης και αναμένεται μετά και τον έλεγχό τους, ο οποίος διεξάγεται αυτή τη περίοδο να έχουν εγκριθεί έως τα τέλη Μαρτίου του 2016.
 - Όσον αφορά στο τμήμα Αλφειός – Κυπαρισσία – Καλαμάτα, με την έκδοση της Απόφασης έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων για το τμήμα Καλό Νερό – Καλαμάτα, η ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. θα προχωρήσει άμεσα στην έγκριση των μελετών και την παραλαβή της σύμβασης, ενώ ήδη εξετάζεται η δυνατότητα ένταξης των υπολοίπων μελετών (Β' φάσης), στα χρηματοδοτικά εργαλεία που αναζητούνται για την υλοποίηση του έργου.
- Σχετικά με τη κατασκευή του έργου Πάτρας – Πύργου – Καλαμάτας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι την παρούσα χρονική στιγμή η ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. πρόκειται να καταθέσει άμεσα πρόταση, για την εξασφάλιση χρηματοδότησης μελέτης σκοπιμότητας και βιωσιμότητας, τα αποτελέσματα της οποίας θα αξιοποιηθούν για την αναζήτηση χρηματοδοτικών εργαλείων για την κατασκευή του εν λόγω έργου.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία και διευκρίνιση.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΥΡΔΑΣ
